



**COMUNE DI POMARANCE**  
Provincia di Pisa

PROGRESSIVO  
GENERALE

3  
**N. 649**

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

**DETERMINAZIONE**

**N. 379 del 12 OTT. 2011**

Copia

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA POSTA A FIANCO DELLA PIAZZA DI S.DALMAZIO FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE TURISTICA DEL CENTRO STORICO.

COD. CUP F68C11000040004

COD. CIG 136664819B

Approvazione Certificato Regolare Esecuzione  
Liquidazione Stato Finale dei Lavori

ESECUTIVA

*immediatamente*

dal

**27 OTT. 2011**

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto, annotato in data odierna nel Registro delle Pubblicazioni al N. 1291, viene contestualmente pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per rimanervi esposta nei prossimi 15 giorni.

Li, 9 NOV. 2011

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

*SN*



COMUNE DI POMARANCE  
Provincia di Pisa  
Settore Gestione del Territorio

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA POSTA A FIANCO DELLA PIAZZA DI S.DALMAZIO FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE TURISTICA DEL CENTRO STORICO.

COD. CUP F68C11000040004

COD. CIG 136664819B

Approvazione Certificato Regolare Esecuzione  
Liquidazione Stato Finale dei Lavori

**IL DIRETTORE DEL SETTORE**

VISTA la Determinazione del Direttore del Settore Gestione del Territorio n. 293 del 18.07.2011 con la quale si aggiudicava la "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA POSTA A FIANCO DELLA PIAZZA DI S.DALMAZIO FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE TURISTICA DEL CENTRO STORICO" alla ditta Geo Alpi Italiana s.r.l. Protezioni Civili con sede in Feltre BL per l'importo complessivo di € 28.837,68 IVA esclusa; il quadro economico risulta così distribuito :

**QUADRO ECONOMICO**

Per lavori aggiudicati :

	€	28.876,57
<b>TOTALE</b>	€	<b>28.876,57<sup>(1)</sup></b>

Somme a disposizione Amministrazione Comunale :

• IVA 20% su € 28.876,57	€	5.775,31		
• Fondo art. 92	€.	597,39		
• Economia	€.	<u>1.191,52</u>		
	€.	7.564,22		
			€.	<b>7.564,22<sup>(2)</sup></b>

**TOTALE GENERALE** € **36.440,79<sup>(1+2)</sup>**

- DATO atto che, la somma complessiva di € **36.440,79** (somme a disposizione dell'Amministrazione comprese) trova la copertura finanziaria al Cap. 2841 Imp. 1299/10 sub 1345 del bilancio di previsione 2011;

VISTO il Certificato Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 13.09.2011 con il quale si attestava l'esecuzione a regola d'arte della "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA POSTA A FIANCO DELLA PIAZZA DI S.DALMAZIO FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE TURISTICA DEL CENTRO STORICO"

RILEVATO che lo stato finale ammonta a € 28.837,68 (IVA esclusa) e che in corso d'opera non sono stati corrisposti acconti alla ditta Geo Alpi Italiana s.r.l. Protezioni Civili con sede in Feltre BL, e pertanto si rileva un credito residuo nei confronti della ditta che ammonta a € **28.837,68** oltre IVA;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e l'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 in materia di competenze dei responsabili dei settori e dei servizi;

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2011 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2011;

## **DETERMINA**

Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dello "**RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA POSTA A FIANCO DELLA PIAZZA DI S.DALMAZIO FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE TURISTICA DEL CENTRO STORICO**" redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Andrea Cappellini dal quale risulta che le opere sono regolarmente compiute ;

Di approvare lo Stato finale dei lavori dal quale si evince che la somma spettante alla ditta Geo Alpi Italiana s.r.l. Protezioni Civili con sede in Feltre BL ammonta ad €. 28.837,68 oltre IVA;

Di liquidare in favore della ditta Geo Alpi Italiana s.r.l. protezioni Civili con sede in Feltre BL gli interventi della "**RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA POSTA A FIANCO DELLA PIAZZA DI S.DALMAZIO FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE TURISTICA DEL CENTRO STORICO**" la somma di € 28.837,68 + IVA al 21% per €. 6.055,91 per un totale di **€ 34.893,59** a saldo di ogni suo onere per i lavori in epigrafe;

1. Di dare atto che la spesa di **€ 34.893,59** trova regolare copertura finanziaria al Cap. 2841 Imp. 1299/10 sub 1345 del bilancio di previsione 2011;
2. il Direttore del Settore Bilancio e Finanze provvederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto, previo visto di regolarità del competente ufficio, **entro 90 giorni** dalla presentazione di regolari fatture.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
f.to Geom. Andrea Cappellini

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
f.to Arch. Roberta Costagli

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151,  
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Pomarance, li .....

27 OTT. 2011

€ 34.893,59

Cap. 2841 Imp. 1299/10

Il Direttore del Settore  
Bilancio e Finanze  
f.to Rodolfo Dott. Noccetti



Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA POSTA A FIANCO DELLA PIAZZA DI S.DALMAZIO FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE TURISTICA DEL CENTRO STORICO.

---

## STATO FINALE DEI LAVORI



Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA POSTA A FIANCO DELLA PIAZZA DI S.DALMAZIO FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE TURISTICA DEL CENTRO STORICO.

**STATO FINALE  
CONTABILITA'**

**Art. 04 ALLESTIMENTO CANTIERE**

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e l'approntamento della segnaletica stradale.

A corpo €. 2.000,00 = €. 2.000,00

**Art. 05 DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE**

Pulizia e disbosco di scarpate e pareti rocciose eseguita da personale altamente specializzato rocciatore operante in corda doppia con sistemi ed attrezzature alpinistiche da calata muniti di motosega e quant'altro necessario ad eliminare tutta la vegetazione arborea e l'accatastamento dei materiali di risulta in cantiere escluso il trasporto a discarica. Rimangono escluse le sole operazioni di cippatura e di abbattimento di alberature ad alto fusto pagate con il relativo prezzo di elenco.

Strada accesso scuola 21,00 x 6,00 = mq. 126,00

9,00 x 8,50 = mq. 76,50

Strada dir. Siena 20,00 x 6,00 = mq. 120,00

mq. 322,50

mq. 322,50 x €./mq. 6,50

= €. 2.096,25

**Art. 06 ABBATTIMENTO DI PIANTE AD ALTO FUSTO SU PARETI ROCCIOSE**

Abbattimento di ogni pianta ad alto fusto di diametro alla base superiore ai 10 cm. compreso accatastamento delle stesse in cantiere ed

escluso il trasporto a discarica. Eseguito con le necessarie precauzioni per evitare possibili danni alla linea della media tensione.

n. 20 x €/cad. 200,00

= €. 4.000,00

**Art. 07**

**SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI VEGETALI**

Smaltimento e recupero dei rifiuti vegetali dovrà essere effettuato presso centro autorizzato, dovrà essere predisposto apposito formulario nel quale sarà annotato il produttore (Comune di Pomarance), il trasportatore (n. autorizzazione e mezzo di trasporto) ed il ricevente (centro di recupero c e n. autorizzazione); alla D.L. dovranno essere tempestivamente consegnate le due copie (produttore/detentore e detentore) corredate di tagliando di pesa.

Formulario del 26.08.11 t. 7,00

Formulario del 26.08.11 t. 8,00

Formulario del 29.08.11 t. 9,00

t.24,00

t. 24,00 x €/t. 65,00

= €. 1.560,00

**Art. 08**

**RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA DIAM. MM.2,70**

Fornitura e posa in opera su parete rocciose di rivestimento costituito da rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale 8x10 in filo metallico di mm. 2,70 del tipo "C" ricotto e zincato. La rete, in teli di lunghezza ml. 2,00 oppure ml. 3,00, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete, oppure all'altezza predisposta, ad una struttura di contenimento, pagata con relative voci di elenco e costituita da funi in trefolo d'acciaio zincato sostenute da ancoraggi in acciaio zincato ad aderenza migliorata FeB44K muniti di gancio o golfare passacavo. I teli di rete, contigui, dovranno essere accostati e legati tra loro ogni 40 cm. con filo metallico zincato del diam. 1,2 mm., stessa legatura sarà effettuata alle funi correnti di sommità ed alla struttura di contenimento inferiore ed eventuale intermedia, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. È compreso l'onere per lavoro eseguito fino a mt. 50 dal piano stradale e per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro

per dare il lavoro finito a regola d'arte. computato per mq. di rete metallica effettivamente stesa.

Fascia 1	4,60 x 3,00 = mq.	13,80
Fascia 2	4,60 x 3,00 = mq.	13,80
Fascia 3	5,20 x 3,00 = mq.	15,60
Fascia 4	5,90 x 3,00 = mq.	17,70
Fascia 5	6,10 x 3,00 = mq.	18,30
Fascia 6	5,50 x 3,00 = mq.	16,50
Fascia 7	5,50 x 3,00 = mq.	16,50
Fascia 8	8,00 x 3,00 = mq.	24,00
Fascia 9	9,00 x 3,00 = mq.	27,00
Fascia 10	9,80 x 3,00 = mq.	29,40
Strada dir. Siena		
Fascia 11	6,80 x 3,00 = mq.	20,40
Fascia 12	6,40 x 3,00 = mq.	19,20
Fascia 13	8,20 x 3,00 = mq.	24,60
Fascia 14	8,70 x 3,00 = mq.	26,10
Fascia 15	11,80 x 3,00 = mq.	35,40
Fascia 16	12,20 x 3,00 = mq.	36,60
Fascia 17	4,00 x 3,00 = mq.	12,00
Fascia 18	5,00 x 1,50 = mq.	7,50
		<u>mq. 374,40</u>

mq. 374,40 x €/mq. 15,50

= €. 5.803,20

#### Art. 09

#### CHIODATURA LUNGHEZZA FINO A MT. 2,00

Chiodatura eseguita mediante perforazione con attrezzatura manuale a rotopercolazione diritta o inclinata in terreni di qualsiasi natura e consistenza, diam. massimo m. 45 armata con barra metallica FeB44K diam. 24 con estremità filettata per una profondità massima di ml. 2,00 compreso iniezione di malta cementizia previa pulizia del foro, compreso montaggio e smontaggio a fine lavori delle attrezzature necessarie, tracciamento, fornitura e posa del ferro di armatura, compreso piastra e bullone se richiesto, rettifica delle teste delle barre ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Strada accesso scuola	11 x 2,00 = ml.	22,00
	26 x 1,50 = ml.	39,00
strada dir. Siena	7 x 2,00 = ml.	14,00
	23 x 1,50 = ml.	34,50
	2 x 2,00 = ml.	4,00
		<u>ml. 113,50</u>

ml. 113,50 x €/ml. 78,50

= €. 8.909,75

#### Art. 10

#### FUNE DI ACCIAIO ZINCATO DIAM. M.12.

Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune diam. mm.12 in trefoli d'acciaio zincato AT (anima tessile) per la realizzazione di

struttura di sostegno, collegamento e contenimento, reticoli e ancoraggi. Compresa la tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.

Diagonali ml. 325,00

Orizzontali 2x50+16+10+4) ml. 130,00

ml. 455,00

ml. 455,00 x €/ml. 12,00

= €. 5.460,00

**sommano**

€. 29.829,20

Ribasso del 3,500% su 29.829,20 – 1.500,00

€. 991,52

**Totale**

€. 28.837,68

Pomarance li, 13.09.11

L'Impresa

(Geo Alpi Italiana Protezioni Civili s.r.l.)

Geo ALPI ITALIANA s.r.l.  
"Protezioni Civili"

Comune di Pomarance  
Tecnico Istruttore  
Cappellini Geom. Andrea

2011-08-29 11:49

Gruppo GRANCHI

+39 0588 62631 >>

043956667 P 3/3

**GRANCO RIFIUTI**

D.M. del 1° aprile 1998, n. 145  
Direttiva Ministeriale Ambientale 9 aprile 2002  
D.Lgs. 3 aprile 2008, n. 152, art. 193 e succ. integr.

26.08.2011

09

TORE o DETENTORE

ne o Ragione sociale GEOLPI ITALIANA SRL  
no CANT. S. DALMAZIO - POMARANACE - PISA

fis. 00.73.46.4.0258 N. Aut./Albo del

DESTINATARIO

denominazione e Ragione sociale TOSCANA ECO VERDE S.P.A.  
UL. S. PIETRO DI RECUPERO  
Luogo di Destinazione Località di Ferro, 296  
56045 POMARANACE (PI)  
C.F./P.I. 0166978 0502

Cod. fis. N. Autorizz. / Albo 3376 del 03.07.07

3 TRASPORTATORE

Denominazione e Ragione sociale GRANCHI s.r.l.  
Indirizzo Loc. Ponte di Ferro, 296  
56045 POMARANACE (PI)  
C.F. e P.I.A. 01248990507

Cod. fis. N. Autorizz. / Albo 1100.1443 del 14.07.07

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento  di

ANNOTAZIONI

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto RIFIUTI BIODEGRADABILI

CODICE del RIFIUTO 2001201 STATO FISICO  1  3  4 CARATTERISTICHE DI PERICOLO N. COLLI/CONTENITORI 1

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero  Smaltimento R13 CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITÀ

Kg. 10.000  Litri 7.000 Key 7 PERCORSO Se diverso dal più breve 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID  SI  NO

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE [Signature] FIRMA DEL TRASPORTATORE [Signature]


10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo AS773NS Targa rimorchio Cagnome e Nome Conducente COLELLI ROBERTO Date e Ora Inizio trasporto 26.08.2011 14:00

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:  Accettato per intero  Accettato per la seguente quantità:  Kg. 7.000 Key  Litri  Respiro per le seguenti motivazioni:

Data 26.08.2011 ora 14:59 Firma del Destinatario [Signature]



Al sensi del Par. 15, 2° comma del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 a

Il Gruppo Europeo del Rifiuto è stato assistito dal Nuovo Ebro del P.I.A. di cui alla Convenzione 2000/3307/CE, modificata dai Decreti 2001/115/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

4

# ORIVULARIO RIFIUTI

D.M. del 21 aprile 2009, n. 345  
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002  
D.Lgs. 3 aprile 2008, n. 152, art. 193 e succ. integ.

26/08/2011

109 / 245778 / XRC

### 1 PRODUTTORE o DEPOSITATORE

Denominazione o Ragione sociale GEOALPI ITALIANA SAI  
Unità Locale COM. S. DALMAZIO - POMARANCE - PISA  
Cod. fis. \_\_\_\_\_ N. Aut./Albo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale YOGGANA ECO VERDE s.r.l.  
U.L. ATTIVITA' DI RECUPERO  
Luogo di Destinazione Loc. Ponte di Ferro, 296  
56045 Pomarance (PI)  
C.F./P.I. 01669780502  
Cod. fis. \_\_\_\_\_ N. Autorizz. / Albo 3616 del 03/07/07

### 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale GRANCHI s.r.l.  
Indirizzo Loc. Ponte di Ferro, 296  
56045 POMARANCE (PI)  
C.F. e P.IVA 01248990507  
Cod. fis. \_\_\_\_\_ N. Autorizz. / Albo F1001413 del 1.10.10.7

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento  di \_\_\_\_\_

### ANNOTAZIONI

### 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto RIFIUTI BIODEGRADABILI

CODICE del RIFIUTO <u>2001201</u>	STATO FISICO <u>S. N. P.</u>	CARATTERISTICHE DI PERICOLO -	N. COLLI/CONTENITORI <u>1</u>
--------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO <input checked="" type="checkbox"/> Recupero <input type="checkbox"/> Smaltimento <u>R13</u>	CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE -
--	--------------------------------------

6 QUANTITÀ <input checked="" type="checkbox"/> Kg <u>10000</u> <input type="checkbox"/> Litri	7 PERCORSO Se diverso dal più breve _____	8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
---	--	--


9 FIRME  
FIRMA DEL PRODUTTORE/DEPOSITATORE [Signature]  
FIRMA DEL TRASPORTATORE Coelli Roberto

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO  
Targa automezzo DS 773 NS Targa rimorchio \_\_\_\_\_  
Cognome e Nome Conducente COELLI ROBERTO Data e Ora Inizio trasporto 26/08/2011 10.55

11 RISERVATO AL DESTINATARIO  
Si dichiara che il carico è stato:  Accettato per intero  Accettato per la seguente quantità:  Kg 8000 kg  
 Litri  
 Respinto per le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_

Data 26/08/2011 Ora 17.200  
Firma del Destinatario [Signature]

56045 Pomarance (PI)  
C.F./P.I. 01669780502




Il presente documento è valido ai fini dell'iscrizione del rifiuto nel Registro Nazionale dei Rifiuti. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato del presente documento. Il presente documento è valido ai fini dell'iscrizione del rifiuto nel Registro Nazionale dei Rifiuti. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato del presente documento.

51



Riqualificazione dell'area posta a fianco della piazza di S.Dalmazio finalizzata alla fruizione turistica del centro storico.

SCHEMA RETI ARMATE

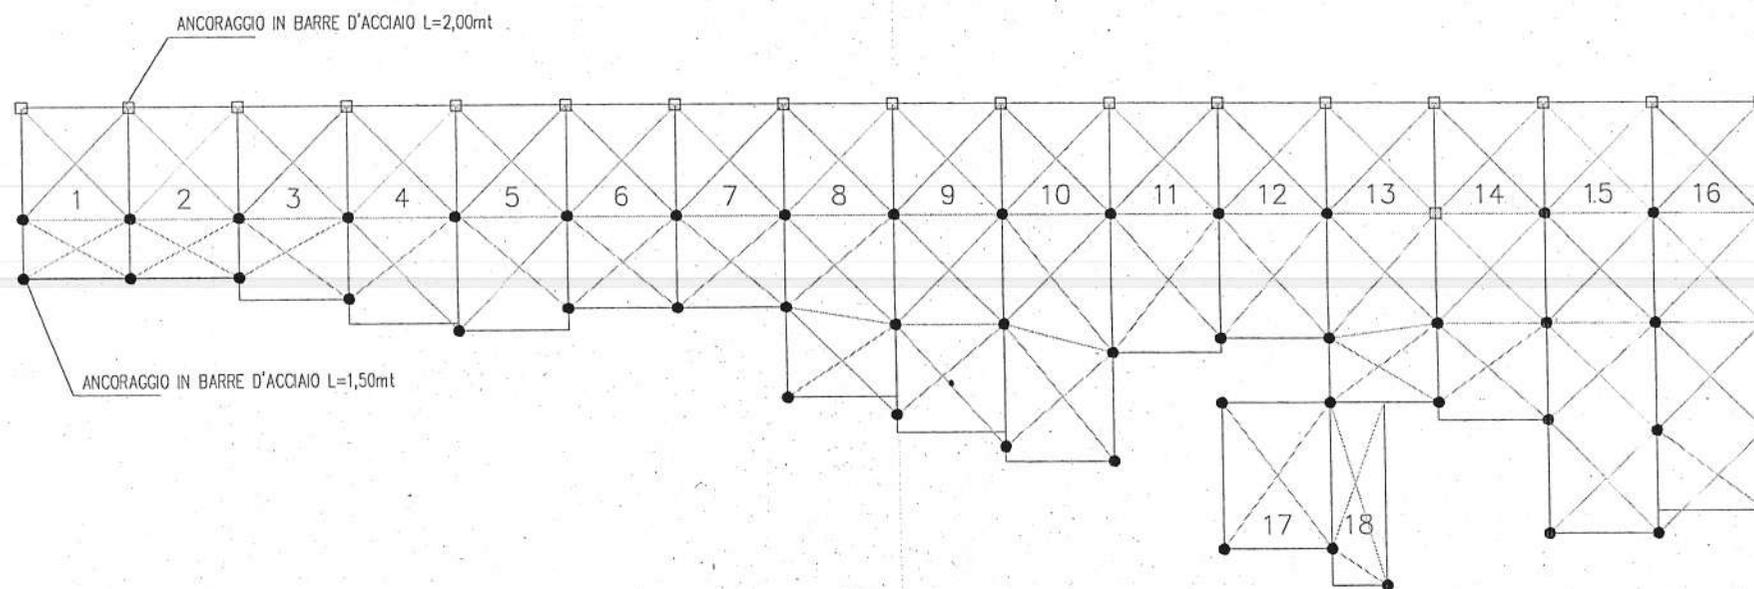

SCALA 1:200



## COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa  
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO



LAVORI DI : RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA POSTA A FIANCO DELLA PIAZZA DI  
S.DALMAZIO FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE TURISTICA DEL CENTRO STORICO  
COD. CUP F68C11000040004  
COD. CIG 136664819B

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SETTORE G.d.T. : N. 293 del 18.07.11  
IMPRESA : GEO ALPI ITALIANA s.r.l. PROTEZIONI CIVILI con sede in Feltre BL

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno DUEMILAUNDICI (2011) il giorno TREDICI (13) del mese di SETTEMBRE (09) in  
S.Dalmazio del Comune di Pomarance.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. **Andrea Cappellini** :

#### A) RELAZIONE

Vista la Determinazione del Direttore del Settore Gestione del Territorio n. 293 del  
18.07.2011 con la quale si aggiudicava la "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA POSTA A  
FIANCO DELLA PIAZZA DI S.DALMAZIO FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE TURISTICA  
DEL CENTRO STORICO" all'impresa **GEO ALPI ITALIANA s.r.l. PROTEZIONI CIVILI  
con sede in Feltre BL** per l'importo complessivo di € 15.696,00 ( oneri per la sicurezza  
€ .800,00)oltre IVA; il quadro economico risulta così distribuito :

#### QUADRO ECONOMICO

Per lavori aggiudicati	:	€	28.876,57
		TOTALE	€ 28.876,57 <sup>(1)</sup>
<u>Somme a disposizione Amministrazione Comunale :</u>			
• IVA 20% su € 28.876,57		€	5.775,31
• Fondo art. 92		€	597,39
• Economie		€	1.191,52
		€	<u>7.564,22</u>

Proceduto alla ricognizione dei singoli interventi in contraddittorio con l'impresa ;

Verificato che risultano ultimati, e sono stati svolti in conformità delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori nel complesso dell'intervento;

Riscontrati tutti i documenti contabili costituiti dallo stato finale dei lavori ;

VERIFICATO :

Che l'importo complessivo dei lavori quale risulta dal conto finale in data 13.09.2011 ammonta a nette € **28.837,68** ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate originariamente ;

Che durante l'esecuzione dei lavori non è stato emesso nessun acconto all'impresa appaltatrice ;

Che l'impresa ha firmato i registri di contabilità senza riserve ;

ACCERTATO :

Che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili ;

Che i prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono quelli contrattuali ;

Che ,durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto nessun infortunio degno di particolare menzione ;

Che i lavori nel complesso sono stati diretti per tutta la loro durata dal Geom. Andrea Cappellini .

## ***B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE***

Alla visita di collaudo tenutasi il giorno 13.09.2011 è intervenuto il Sig. Franco Zannin in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Geo Alpi Italiana s.r.l. Protezioni Civili con sede in Feltre BL e il Direttore dei Lavori Geom. Andrea Cappellini .

Con la scorta degli atti contabili furono ispezionati i lavori eseguiti e fu constatato che essi erano stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle disposizioni date all'atto pratico e nel rispetto delle norme sanitarie dalla Direzione Lavori .

Vennero verificate le quantità ecc. riscontrandole uguali a quelle riportate nello stato finale.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che il lavoro nel complesso è stato eseguito a regola d'arte, nel rispetto delle norme igieniche e in conformità alle prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori ;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità ecc. alle annotazioni riportate sul conto finale;
- che l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, come risulta dallo Stato Finale ammonta ad **€ 28.837,68** e trova copertura finanziaria nelle somme stanziare originariamente ;
- che i lavori complessivamente risultano ultimati;
- che l'impresa ha ottemperato a tutte le disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

## CERTIFICA

Che gli interventi sopra elencati e dettagliati, eseguiti dall'impresa Geo Alpi Italiana s.r.l. Protezioni Civili con sede in Feltre BL in base alla Determinazione del Direttore del Settore G.d.T. n. 293 del 18.07.2011 sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue :

• Ammontare netto del conto finale	€ 28.837,68
• A dedurre i certificati di acconto emessi	€ -----
• Resta il credito all'impresa in	<b>€ 28.837,68</b>

delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato , salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Pomarance lì 13.09.2011

L'IMPRESA **GEO ALPI ITALIANA s.r.l.**  
 (Geo Alpi Italiana s.r.l.) "Protezioni Civili"

*[Handwritten signature of the company representative]*


 DIRETTORE DEI LAVORI  
 (Geom. Andrea Cappellini)

*[Handwritten signature of Geom. Andrea Cappellini]*
