



COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Riqualificazione del Sistema Turistico - Interventi su viabilità urbana di Pomarance : traversa viale S. Piero - S.R.T. n. 439
Codice CUP : F67H14 00057 000 4 Codice CIG : 5807111398

COMMITTENTE: Comune di Pomarance

IMPRESA: GALLETTI Amerigo & Arias s.r.l. - Pomarance (PI)

Contratto in data 04/02/2015 rep. n. 2511 di euro 76.108,36

Data Offerta:	31/10/2014	IMPORTO DEL PROGETTO:	79 528.58
Data Consegna:	26/11/2014	Somme a Disposizione:	19 471.42
Data Inizio Lavori:	26/11/2014	Importo per la Sicurezza:	1 958.05
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	11 158.44
Data Utile per Ultimazione:	23/02/2015	IMPORTO DI VARIANTE	116 400.13
Giorni di Sospensione:	85	Somme a Disposizione (variante):	26 394.69
Numero di Sospensioni	2	Importo per la Sicurezza (variante):	1 958.05
Nuova Data Ultimazione:	19/05/2015	Importo per la Manodopera (variante):	14 361.80
Data FINE LAVORI:	15/05/2015	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	—
		Giorni impiegati in MENO:	4



COMUNE DI POMARANCE - P.zza S. Anna, 1 56045 Pomarance (PI)
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - Servizio LL.PP.

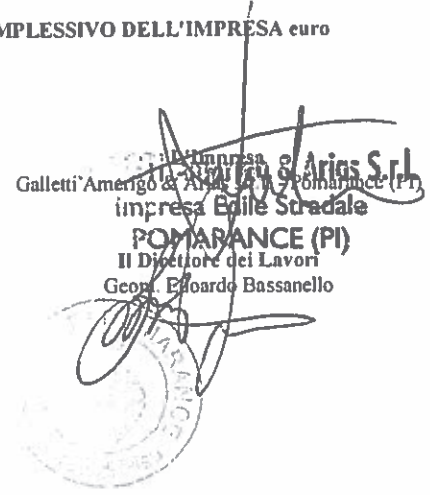
Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 01.A04.005.0 02	SCAVI : compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m30,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'agotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m. Sono esclusi gli eventuali oneri di scarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:- terreni sciolti: terreni di media consistenza, di qualsiasi natura, asciutti o poco umidi (argille, sabbie e ghiaie prive di cementazione) con resistenza a compressione < 70 kg/cmq- rocce tenere: formazioni di ceneri vulcaniche, pozzolane, tufo poco litoido con resistenza allo schiacciamento tra i 70 ed i 100 kg/cmq- rocce compatte: pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss, ardesie, ecc.) e rocce magmatiche effusive (basalti, trachiti, etc.) con resistenza a compressione > 100 kg/cmq Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in terreni sciolti da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00	SOMMANO mc. 414,61	18,41	7'632,97
2 01.F06.002.0 56	SCARICHI E FOGNATURE: realizzati con tubazioni in P.V.C. , pozzetti prefabbricati in cls compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi. Sono esclusi gli scavi, le tracce, la realizzazione di cavedi e chiusure. Da valutarsi a metro lineare o a numero. Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm (prezzario Regione Toscana)	SOMMANO ml. 102,00	43,33	4'419,66
3 01.F06.011.0 08	SCARICHI E FOGNATURE : Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino e/o griglia in ghisa con tappo a contenimento in pvc termoresistente sifonato , compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. Pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm (prezzario Regione Toscana)	SOMMANO cad. 4,00	393,79	1'575,16
4 04.B12.001.0 01	CORPI STRADALI :Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm (prezzario Regione Toscana)	SOMMANO mc. 191,25	21,70	4'150,13
5 04.E02.002.0 01	PAVIMENTAZIONI STRADALI : Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm (Prezzario Regione Toscana)	SOMMANO mq. 1'500,00	13,96	20'940,00
6 04.E02.002.0 02	PAVIMENTAZIONI STRADALI : per ogni cm in più o in meno alla voce precedente (Prezzario Regione Toscana)	SOMMANO mq. 3'000,00	2,19	6'570,00
7 04.E02.003.0 03	PAVIMENTAZIONI STRADALI : con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm (Prezzario Regione Toscana)	SOMMANO mq. 3'971,19	8,53	33'874,25
8 04.E07.001.0 02	SEGNALETICA ORIZZONTALE : Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, della, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento larghezza cm 15 (Prezzario Regione Toscana)	SOMMANO ml. 1'620,00	0,79	1'279,80
9 04.E07.001.0 01	SEGNALETICA ORIZZONTALE : Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, della, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc (Prezzario Regione Toscana)	SOMMANO mq. 10,00	6,17	61,70
10 04.F07.003.0 02	DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto e rivestita lateralmente in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm	SOMMANO ml. 53,00	50,82	2'693,46
11 04.F07.006.0 01	DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare),			
	A RIPORTARE			83'197,13

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			83'197,13
7	compreso scavo - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 SOMMANO ml.	53,00	14,22	753,66
12 04.F07.007.0 01	DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate. Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN ISO 11958), compreso scavo- conducibilità idraulica verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m) SOMMANO mq.	159,00	25,57	4'065,63
13 ZNP01	SEGNALETICA VERTICALE : Provvista e posa in opera di segnaletica verticale compreso scavo, getto plinto in calcestruzzo dim .30x30x50, rentierro ed allontanamento delle materie di risulta, compreso piantana in acciaio zincato e cartello , ed ogni altro onere e magistero per rednere l'opera compiuta a regola d'arte. Posato su marciapiede SOMMANO cad.	1,00	126,52	126,52
14 ZNP02	SEGNALETICA VERTICALE : Provvista e posa in opera di segnamargine in pvc su banchine in terra secobdo norme di codice della strada interrati almeno cm. 30/35 con regolare assestamento della terra per garantire la stabilità e la verticalità dei segnalimiti ed ogni altro onere e magistero per rednere l'opera compiuta a regola d'arte. SOMMANO cad.	6,00	24,65	147,90
15 ZNP04	FINITURE STRADALI : Lavori di sbanchinatura Regolarizzazione delle sole banchine stradali eseguita con mezzi meccanici compreso nel prezzo il carico, trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte SOMMANO mq.	1'768,30	1,49	2'634,77
16 ZNP05	FINITURE STRADALI : Formazione di banchina stradale , prevo scotico, realizzata con idoneo materiale di cava stabilizzato pezzatura 0-30 mm., compattato con minirulli, per lo spess. medio di cm. 10/15. IL materiale dovrà essere compreso nella categoria A1/a della classificazione CNR-UNI 10006 ed alle prescrizioni del capitolato norme tecniche, ed ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte SOMMANO mc.	265,24	23,54	6'243,75
17 ZNP06	FINITURE STRADALI : Ricavature fosse. Ricavatura delle fosse di raccolta delle acque lungo le banchine stradali eseguito con mezzi meccanici, compreso gli oneri per la demolizione dei trovanti rocciosi sino alle dim. di mc. 0,50, il carico, traporto e conferimento a discarica delle materie di risulta, l'eventuale smontaggio e rimontaggio dei segnamergini presenti, ed ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte SOMMANO ml.	879,80	2,44	2'146,71
18 ZNP09	FINITURE STRADALI : Provvista e posa in opera di canaletta in c.a.v. 1/2 tubo diam. mm. 500, compreso il trasporto in cantiere, l'alloggiamento nelle sede di posa, il sottofondo ed i rinfiango laterale in calcestruzzo classe Rck. 200 dello spessore medio di cm. 10 armato con n. 1 foglio di R.E. diam. mm. 10 foglio 10x10 ed ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. SOMMANO ml.	53,00	59,14	3'134,42
19 ZNP10	FINITURE STRADALI : Fornitura e realizzazione di staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino tomitti diametro 10-12 cm trattati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali a sezione mezzotonda interasse di 2 m, montanti verticali di sezione circolare di altezza fuori terra di 1 m, ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, intervento completo di eventuali plinti di fondazione di 30x30x30 cm compreso tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo ed in riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè d'opera dall'impresa ed ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. SOMMANO ml.	95,00	50,18	4'767,10
	Parziale LAVORI A MISURA euro			107'217,59
	RIBASSO del 5,15% da considerare su euro			107'217,59
	A R I P O R T A R E			107'217,59

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			114'427,67
7	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
23 17.S05.001.0 14	<p>OPERE PROVVISORIALI previsti nel PSC(Apprestamenti -Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a)): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore</p> <p>Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.</p>	SOMMANO cad. 20,00	16,10	322,00
24 17.S06.004.0 11	<p>ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c)</p> <p>Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.</p> <p>Adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile</p>	SOMMANO cad. 1,00	414,00	414,00
25 17.S06.004.0 13	<p>ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c)</p> <p>Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.</p> <p>Adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile</p>	SOMMANO cad. 1,00	333,50	333,50
26 17.S07.002.0 01	<p>MEZZI (Dispositivi di protezione collettiva DPC) E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d))</p> <p>Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria</p>	SOMMANO cad. 5,00	10,10	50,50
27 17.S07.002.0 06	<p>MEZZI (Dispositivi di protezione collettiva DPC) E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d)</p> <p>Segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri</p>	SOMMANO cad. 5,00	4,86	24,30
28 17.S07.002.0 07	<p>MEZZI (Dispositivi di protezione collettiva DPC) E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d))</p> <p>Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio</p>	SOMMANO cad. 5,00	32,72	163,60
29 17.S07.002.0 08	<p>MEZZI (Dispositivi di protezione collettiva DPC) E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d))</p> <p>Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno</p>	SOMMANO cad. 10,00	22,73	227,30
30	<p>MEZZI (Dispositivi di protezione collettiva DPC) E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all.</p>			
	A R I P O R T A R E			115'962,87

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			115'962,87	
17.S07.002.0 09	XV punto 4.1.1 lett. d) Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40	SOMMANO cad.	5,00	6,45	32,25
31 17.S07.002.0 10	MEZZI (Dispositivi di protezione collettiva DPC) E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri	SOMMANO cad.	1,00	2,02	2,02
32 17.S07.002.0 13	MEZZI (Dispositivi di protezione collettiva DPC) E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri	SOMMANO cad.	1,00	7,54	7,54
33 17.S07.003.0 01	MEZZI (Dispositivi di protezione collettiva DPC) E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389	SOMMANO cad.	1,00	18,45	18,45
34 17.S07.003.0 02	MEZZI (Dispositivi di protezione collettiva DPC) E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura	SOMMANO cad.	1,00	31,72	31,72
35 17.S07.003.0 03	MEZZI (Dispositivi di protezione collettiva DPC) E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) Attrezzature di primo soccorso Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi	SOMMANO cad.	1,00	7,61	7,61
36 17.S07.004.0 01	MEZZI (Dispositivi di protezione collettiva DPC) E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.	SOMMANO cad.	1,00	41,42	41,42
37 17.S08.002.0 02	MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni in relazione allo specifico cantiere	SOMMANO ora	2,00	50,00	100,00
38 17.S08.002.0 05	MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto in relazione allo specifico cantiere	SOMMANO ora	4,00	13,64	54,56
39 17.S08.003.0 01	MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori in relazione allo specifico cantiere	SOMMANO ora	4,00	31,82	127,28
	A RIPORTARE			116'385,72	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 1'958,05 Importo dei Lavori per la Manodopera su cui NON applicare il Ribasso euro 14'361,80 Incidenza Manodopera - IM = 14'361,80 / 114'442,08 = 0,125494049042101			
	LAVORI A MISURA euro			107'217,59
	RIBASSO del 5,15% da applicare su euro 107'217,59 =			
	(SAL * (1 - IM) * R) = (107'217,59 * (1 - 0,125494049042101) * -0,0515) = euro			-4'828,76
	PER LAVORI A MISURA euro			102'388,83
	LAVORI IN ECONOMIA euro			7'210,08
	RIBASSO del 5,15% da applicare su euro 7'210,08 =			
	(SAL * R) = (7'210,08 * -0,0515) = euro			-371,32
	PER LAVORI IN ECONOMIA euro			6'838,76
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			1'958,05
	TOTALE euro			111'185,64
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			111'185,64
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u> Certificato N.1 del 04/02/2015 euro			65'500,00
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			65'500,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			65'500,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			45'685,64
	 Pomarance, 18/05/2015 <div style="text-align: center;">  <p>Galletti Amerigo & Arias S.r.l. impresa Edile Stradale POMARANCE (PI) Il Direttore dei Lavori Geom. Edoardo Bassanello</p> </div>			
	A RIPORTARE			
